




नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय




प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ

आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समिक्षा



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय




संभाग	बाली/वस्तुको नाम	संभाग क्षेत्र अन्तर्गत समेटिने स्थानहरू (गा.पा./न.पा.)	वडा संख्या	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हेक्टर/संख्या)
जोन	स्याउ (स्थापना २०७५)	थासाङ गा.पा. को १,३,४ र ५ वडा बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र	२१	१४०० हे. (परियोजना पूर्व १०५० हे.)
	च्यांग्रा (स्थापना २०७८)	मुस्ताङ जिल्ला (लोमान्थाङ, लोधेकर दामोदरकुण्ड र बारागुड मुक्तिक्षेत्र गापा)	११	५१९० माउ (परियोजना पूर्व १०१० माउ)
	सुन्तला (स्थापना २०७५)	म्याग्दी जिल्ला (बे.न.पा., मंगला गा.पा., रघुगंगा गा.पा., अन्नपूर्ण गा.पा.) पर्वत जिल्ला (जलजला गा.पा.) बाग्लुङ जिल्ला (बा.न.पा., काठेखोला गा.पा.)	४७	१०३० हे. (परियोजना पूर्व ७०१ हे.)
	बाँगर (स्थापना २०७६)	म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण गा.पा. (मुख्य सडक छोएको वडाहरू)	३३	१६५३ सं. (५२७ माउ) (परियोजना पूर्व ९६ माउ संख्या)
	आलु (स्थापना २०७८)	म्याग्दी जिल्ला (रघुगंगा गापा ६,७,८ र अन्नपूर्ण गापा ५.६,७ र ८)	७	२०६ हे. (परियोजना पूर्व १२९ हे.)





बंगुर जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १
गा.पा. ६
वडा ३३





आलु जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १
गा.पा. २
वडा ७





स्याउ जोनको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २१

Order 4 kgs (Rs.1000) for FREE DELIVERY




Mustang Golden Apple

Mustang Red Apple





च्यांग्रा जोनको कार्यक्षेत्र



मस्ताङ्ग जिल्ला




जिल्ला १
गा.पा. ३
वडा ११






यस आ.व.मा सुचिकृत भएका लाभान्वितहरूको विवरण



जोन	चालु आ व २०८०/०८१ मा थप सुचिकृत			
	सहकारी	समुह	निजि उद्धमी	जम्मा
सुन्तला	०	१	२२	२३
बंगुर	१	०	७	८
आलु	१	१	१	३
स्याउ	०	०	२३	२३
च्यांग्रा	०	१	१३	१४
जम्मा	२	३	६६	७१



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



१. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:

मुस्ताङ:- स्याउ, च्याङ्ग्रा, आलु, याक चौरी, उवा/जौं


म्याग्दी जिल्ला: सुन्तला, बंगुर, आलु, बाख्रा, तरकारी

२. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको आयात/निर्यातको अवस्था:


बालि वस्तु	निर्यात परिमाण	औषत मुल्य रु
स्याउ	४७२६ मे.टन	११० प्रति के.जि.
च्याङ्ग्रा	८००० वटा	३७,००० प्रति गोटा
आलु (मुस्ताङ)	५७३६.६ मे टन	२०० प्रति पाथि(प्रति पाथि ३ के जि)
च्याङ्ग्रा सुकुटी	२ मे. टन	८५०० प्रति के.जि.
याक सुकुटी	५ मे. टन	६५०० प्रति के.जि.
सुन्तला	३,६९३ मे. टन	८० प्रति केजी




जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व



क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या (सुचिकृत)	उत्पादन मे.ट./संख्या/ली.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१	स्याउ	६८५ हे.	४६७० मे.ट.	९.३४	८.९	५०० हे उत्पादनशिल
२	सुन्तला	१०३० हे.	३७८० मे.ट.	१०.५	१०.८	३६० हे उत्पादनशिल
३	च्याङ्गा	५१९० माउ	५१९० पाठापाठी प्रति वर्ष	१ पाठा/माउ/वर्ष	१.५ पाठापाठी/माउ/ वर्ष	५१९० माउ
४	बङ्गुर	१६५३ सं.	१०५४० पाठापाठी प्रति वर्ष	२० पाठापाठी प्रति माउ प्रति वर्ष (२ वेत)	१२ पाठापाठी प्रति माउ प्रति वेत	५२७ माउ
५	आलु	१९६ हे.	४३५१ मे.ट.	२२.२	१६.७३	



परियोजनाको शुरु आ.व. देखि हाल सम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण (बजेट लाखमा)

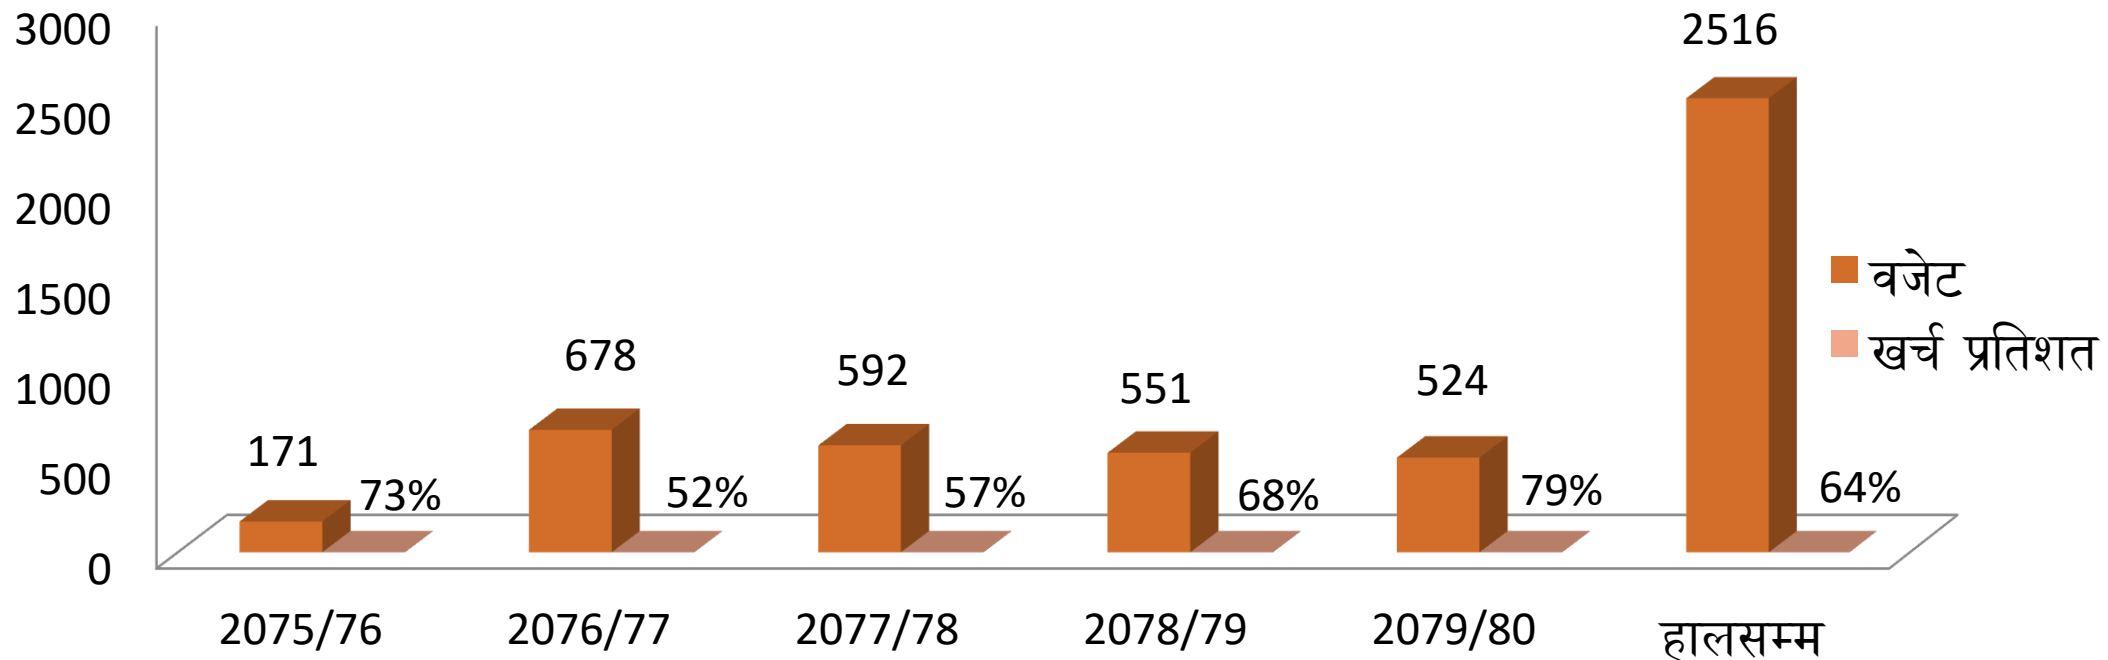



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
१.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण सुधार	संख्या	०	०	७	१३	१०	३०	जोन क्षेत्रभित्र सिंचाइका लागि पोखरी, कूलो निर्माण, पाइप, थोपा सिंचाइ (थप २०५ रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
२.	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग	पटक	१	१	१	१	१	५	ग्रिडिड मेसिन ४, मिनिटिलर ६५, पावर स्प्रे ४१, ग्रास कटर ६०, डिजिटल तराजु ५१, ह्याण्ड स्प्रे २३, फुट स्प्रे ३७, सुकृटी मेसिन ४७, सानो सिकेचर १६३, ठूलो सिकेचर १०, स्याउ पिकर ७१, क्लिपर ४८, करौती ७३, क्रेट २१९० वितरण।
३.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हे.	०	२१.७	२२.६	१०	१०	६४.३	उच्च घनत्व १८००० र स्थानीय बेर्ना १९८४० वितरण
४.	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	०	०	२	१	२	५	धमाङ्, मार्फा, खिङ्गा र कागवेनी गरी ५ वटा ५७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको।




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
५.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक	०	०	१	०	०	१	कोबाङ, मुस्ताङको शिक्षालयमा तरकारी खेती, आलु खेती तथा आलु चिप्स बनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन भएको।
६.	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	१	०	२	०	३	स्याउको बेर्ना उत्पादनको ३ वटा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएका
७.	खोर निर्माण सुधार सहयोग	संख्या	०	०	०	७	१०	१७	बारागुड र लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा.मा १७ वटा च्याङ्गा गोठ सुधार गरिएको।
८.	पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण	संख्या				१	२	३	बारागुड, लोघेकर र लोमान्थाङ गा.पा.मा ३ वटा पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण भएको।




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
१.	कृषि यान्त्रिकरण	पटक	१	१	१	१	१	५	मागको आधारमा कृषि औजार उपकरण वितरण
२.	साना सिंचाई	संख्या	०	९	२१	१९	१८	६७	ट्याङ्की निर्माण पोखरी निर्माण र पाइप वितरण (थप ३६० रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
३.	कृषि बजार भण्डारण प्रशोधन उद्योग	संख्या	०	०	०	१	२	३	१० टन भण्डारण क्षमताका ३ वटा कोल्ड स्टोर
४	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	हे.	८० हे.	१८३ हे.	६९ हे.	२० हे.	१.५ हे.	३५३.५ हे.	कलमी तथा विजु विरुवा वितरण




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
४.	स्थानीय तहसङ्गको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	४	५	२	३	१४	स्क्रीन हाउस निर्माण र विरुवा उत्पादन
५	पशु नक्षश्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	१	१	३	५	५ वटा पशु नक्षश्रोत केन्द्र निर्माण भएको।
६.	खोर सुधार (बंगुर)	संख्या	०	१२	०	७	८	२७	२७ वटा खोर निर्माण सुधार भएको
७.	मासु पसल सुधार निर्माण	संख्या	०	३	२	१	२	८	८ वटा मासुपसल सुधार भएको




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	६१			फिल्ड अनुगमन हुँदै
२	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	५३			फिल्ड अनुगमन हुँदै
३	भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	६			फिल्ड अनुगमन हुँदै
४	कृषि उपज बिक्री वितरण केन्द्र निर्माण	२	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	१५			फिल्ड अनुगमन हुँदै




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
५	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार	१६	हेक्टर	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०६।१६	३			फिल्ड अनुगमन हुँदै
६	प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	१	पटक	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०६।१६				
७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०६।१६				
८	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१४	संख्या	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०६।१६				
९	भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	आलु जोन	२०८०।०६।०५	१			फिल्ड अनुगमन हुँदै




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१०	स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पशु नस्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	१	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	५			फिल्ड अनुगमन हुँदै
११	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	४५	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	१३			फिल्ड अनुगमन हुँदै
१२	विपन्न वर्ग लक्षित उन्नत बंगुरपालन कार्यक्रम	३०	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	१			फिल्ड अनुगमन हुँदै
१३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	९			फिल्ड अनुगमन हुँदै
१४	मासु वसल सुधार कार्यक्रममा सहयोग	२	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	२			फिल्ड अनुगमन हुँदै
१५	खोर सुधार सहयोग	११	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	१३			फिल्ड अनुगमन हुँदै




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
१६	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नस्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	२	संख्या	च्याङ्गा जोन	२०८०।०६।०५	७			फिल्ड अनुगमन हुदै
१७	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम(साइलेज, U M M B, तथा अन्य)	१	पटक	च्याङ्गा जोन	२०८०।०६।०५	३५			फिल्ड अनुगमन हुदै
१८	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	१००	संख्या	च्याङ्गा जोन	२०८०।०६।०५	३५			फिल्ड अनुगमन हुदै
१९	खोर सुधार सहयोग	७	संख्या	च्याङ्गा जोन	२०८०।०६।०५	१६			फिल्ड अनुगमन हुदै



प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
२०	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	२०			फिल्ड अनुगमन हुँदै
२१	सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	९	संख्या	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	२३			फिल्ड अनुगमन हुँदै
२२	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	३			फिल्ड अनुगमन हुँदै




यस आ.व. मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



1. कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना
2. पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना
3. खोर सुधार सहयोग
4. कृषि यान्त्रीकरण सहयोग
5. पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम
6. सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार



आयोजना/कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिहरू




चालु आ.व. २०८०/८१ मा परियोजना कार्यान्वयन एकाइले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू

1. कार्यान्वयन एकाइ क्षेत्रभिन्न आलु, सुन्तला र स्याउमा ३ वटा १० मे. टन क्षमताका कोल्ड स्टोर भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भएको हुनेछ।
2. बंगुरमा १ (कम्तिमा २० माउ) र च्याङ्ग्राका २ (कम्तिमा १५० माउ) पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ।
3. बंगुरमा ११ (कम्तिमा २० बंगुर) र च्याङ्ग्राका ७ (कम्तिमा १०० च्याङ्ग्रा) सुधारिएका खौर निर्माण तथा सुधार भएको हुनेछ।
4. बंगुर र च्याङ्ग्रामा १४५ संख्यामा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ।
5. आलु, सुन्तला र स्याउ जोन क्षेत्रमा २९ वटा साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएको हुनेछ जसबाट थप २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ।



प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण




कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक
	परिमाण	भार	बजेट (लाखमा)	परिमाण	भार	बजेट (लाखमा)	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	५	३.९	१९	३	०.३२	१.६	३७.५
चालू तर्फ	४८२१	९६.१	४७०.२५	१२०९	९.२६	४५.२९	७३.३१
जम्मा	४८२६	१००	४८९.२५	१२११	९.५८	४६.८९	७२.१३



प्रथम त्रैमासिक वित्तीय प्रगति विवरण


वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगति विवरण				
कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन (लाखमा)	पहिलो त्रैमासिक विनियोजन(लाखमा)	पहिलो त्रैमासिक खर्च(लाखमा)	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	१९	१.६	०.६	३७.५
चालू तर्फ	४७०.२५	४५.२९	२६.५४	५८.६०
जम्मा	४८९.२५	४६.८९	२७.१४	५७.८८




प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु - अनुदान कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी
१	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (ऋप कटिङ)	२० जना स्याउ कृषकहरुको बगैचाको ऋप कटिङ गरिएको।
२	व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालन कृषक तालिम	२० जना व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालक कृषकहरु लाभान्वित भएका।
३	पाँचवटै जोन विकास कार्यक्रमको माग आवेदन संकलन गरि फिल्ड अनुगमन कार्य सुरु गरिएको।	




प्रगति नपुगका कारणहरु



प्रगति नपुगका कारणहरु						
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	जोन संचालन अभिमुखीकरण गोष्ठी (आलु जोन र च्याङ्ग्रा जोन)	पटक	२	०	२	समय अभाव
२	परियोजनाको सुरुवात देखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन	पटक	१	०	१	समय अभाव
३	नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय)	पटक	२	१	१	समय अभाव



बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण



क्र.सं.	आ. व. २०७८/७९ सम्म फछ्यौट गर्नु पर्ने बेरुजु विवरण			आ व २०७९/८० को वार्षिक अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु.	बेरुजु फछ्यौटको लागि पेश भएको रकम रु.	कैफियत
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु.	असुल गर्नु पर्ने रकम रु.	जम्मा बेरुजु रकम रु.	नियमित गरेको रकम रु.	असुल गरेको रकम रु.	जम्मा रु.			
१	४६४,२२०	१०५,९००	५७०,१२०	४६४,२२०	१०५,९००	५७०,१२०	०	५७०,१२०	असुल गरेको रकमको सक्कल भौचर सहित सम्परीक्षण गरी दिन २०७९/९/२२ मा परियोजना व्यवस्थापन एकाई, खुमलटारमा बुझाईएको।




जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	०	१	रिक्त
२	कृषि अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	२	२	०	
३	पशु विकास अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	१	०	१	रिक्त
४	प्राविधिक सहायक	१	०	१	रिक्त
५	नायव प्राविधिक सहायक	१	१	०	
६	रा.प.अनं.प्र.प्र. (लेखापाल)	१	०	१	रिक्त
७	रा.प.अनं.प्र.प्र. (ना सु)	१	०	१	रिक्त
८	पशु सेवा तथा कृषि प्राविधिक नायव प्राविधिक सहायक	७	७	०	करार सेवा
९	ह.स.चा.	१	१	०	करार सेवा
१०	का.स.	३	३	०	करार सेवा
जम्मा		१९	१४	५	




परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू




समस्याको किसिमच	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	<p>कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा तहगत तथा निकायगत फरकपन</p> <p>उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्रतिशत फरक रहेको। परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विधि प्रकृया लगायतका विवरणहरू अप्रयाप्त रहेको।</p>	<p>डुप्लिकेशन नहुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने कोशिस गरिएको।</p>
प्राविधिक	<p>जनशक्ति अभाव</p> <p>(प.वि.अ. र प्रा.स. शुरु देखि नै रिक्त तथा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी रिक्त रहेका।</p>	<p>उपलब्ध करारका प्राविधिकलाई जिन्सी तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिईएको।</p> <p>उपलब्ध जनशक्ति बाट जिम्मेवारी बाँडफाड गरि कार्यक्रम संचालन गरिएको।</p>
व्यवस्थापकिय	<p>फराकिलो कार्यक्षेत्र</p> <p>भौगोलिक बिकटताले गर्दा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ आवतजावत गर्न गाह्रो तथा कृषि र पशुसेवाका फरक फरक ५ वटा जौनहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई। उपलब्ध सवारी साधन पुरानो तथा बिग्रिरहने।</p>	<p>बस, ट्याक्सी तथा भाडा गाडी रिजर्व गरी फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।</p>



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू
<p>मुस्ताङ जिल्लाको स्याउ जोन क्षेत्रको १४०० हेक्टर जमिनमा स्याउ खेति हुनुका साथै व्यापक रूपमा क्षेत्र विस्तार भैरहेको हुनाले उत्पादित स्याउको ब्रान्डिङ, बजारिकरण, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका ठुला कार्यक्रमहरूको माग उच्च रहेको जुन जोन विकास कार्यक्रमबाट मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिएको।</p>	<p>मुस्ताङ जिल्लामा स्याउको सुपरजोन निर्माणको लागी आवश्यक शर्तहरू पुरा भएको तथा स्याउको प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना तथा निर्यात गरि मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने उच्च सम्भाव्यता रहेको हुनाले मुस्ताङ जिल्लामा स्याउको सुपरजोन कार्यक्रम सन्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।</p>



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालक कृषक तालिम

व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालक कृषक तालिम



च्याङ्ग्रापालन कृषकहरूलाई व्यवसाय सुधार तालिम

by आरसी टाइम्स — १५ आश्विन २०८०, सोमबार १५:१९




SHARES    

आरसी टाइम्स व्युरो मुस्ताङ्ग, असोज १५

मुस्ताङ्गका च्याङ्ग्रा पालनमा सहभागी कृषकहरूलाई २ दिने व्यवसाय सुधार तालिम दिएर सहजीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन एकाई, मुस्ताङले हालै असोज ११ र १२ गते उपल्लो तीन गाउँपालिकाका किसानहरूलाई व्यवसाय सुधार तालिम दिइएको परियोजना एकाई प्रमुख सुधिर थापाले जनाएका छन ।

परियोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको उपल्लो मुस्ताङका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाँउपालिका, लोमान्थाङ गाँउपालिका र बारागुड मुक्तिक्षेत्र गाँउपालिकाका १४ व्यवसायिक फार्म र ६ किसान समेत गरि २० जनालाई तालिम दिइएको थापाले जनाएका छन ।



मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

स्याउ भण्डारणको लागी चिस्यानगृह



चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

<https://www.bizkhabar.com/agriculture-and-corporate-news/174126.html>



BIZKHABAR.COM

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने काठमाडौं । चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि ...

स्याउ भण्डारणको लागी चिस्यानगृह



स्याउ भण्डारणका लागि चिस्यानगृह प्रभावकारी

धौलागिरी खबर

२०८० आश्विन २८, आईतबार २०:४२ गते मा प्रकाशित


165 0



मार्फाको चिस्यान गृहमा स्याउ भण्डारण गर्दै ।

समाजिक न्यायको लागि
राष्ट्रिय न्यायको लागि
२०७२-२०७३

मार्फा : चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि मुस्ताङका कृषकको स्याउ कुहिएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्न थालेको छ ।




मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

स्याउमा ऋप कटिड गरिदै



स्याउमा ऋप कटिड गरिदै






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

उत्कृष्ट कृषक, कर्मचारी अध्ययन
अवलोकन भ्रमण, जुम्ला

उत्कृष्ट कृषक, कर्मचारी अध्ययन
अवलोकन भ्रमण, जुम्ला






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

उत्कृष्ट कुषक, कर्मचारी अध्ययन
अवलोकन भ्रमण, वन्दिपुर

उत्कृष्ट कुषक, कर्मचारी अध्ययन
अवलोकन भ्रमण, वन्दिपुर






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

घरपझोड कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा परियोजनाको तर्फबाट सुचना केन्द्र सन्चालन





मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

परियोजनाको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा स्याउ भण्डारण गरिदै



मुस्ताङमा उत्पादित उच्च घनत्व स्याउको प्रदर्शनी (घरपझोड महोत्सव)





धन्यवाद
