


नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ

आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिनाको
प्रगति समिक्षा



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय




संभाग	बाली/वस्तुको नाम	संभाग क्षेत्र अन्तर्गत समेटिने स्थानहरू (गा.पा./न.पा.)	वडा संख्या	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हेक्टर/संख्या)
जोन	स्याउ (स्थापना २०७५)	थासाङ गा.पा. को वडा नं. १,३,४ र ५ बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र	२१	१४०० हे. (परियोजना पूर्व १०५० हे.)
	च्यांग्रा (स्थापना २०७८)	मुस्ताङ जिल्ला (लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँ.पा.)	११	५१९० माउ (परियोजना पूर्व १०१० माउ)
	सुन्तला (स्थापना २०७५)	म्याग्दी जिल्ला (बे.न.पा., मंगला गा.पा., रघुगंगा गा.पा., अन्नपूर्ण गाँ.पा.) पर्वत जिल्ला (जलजला गाँ.पा.) बाग्लुङ जिल्ला (बाग्लुङ न.पा., काठेखोला गाँ.पा.)	४७	१०३० हे. (परियोजना पूर्व ७०१ हे.)
	बैंगुर (स्थापना २०७६)	म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण गा.पा. (मुख्य सडक छोएको वडाहरू)	३३	५२७ माउ (परियोजना पूर्व ९६ माउ संख्या)
	आलु (स्थापना २०७८)	म्याग्दी जिल्ला (अन्नपूर्ण गाँ.पा., रघुगंगा गाँ.पा.-५,६,७,८ र वेनी नगरपालिका-१०)	१३	४१० हे. (परियोजना पूर्व १२९ हे.)





बंगुर जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १
गा.पा. ६
वडा ३३





आलु जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १
गा.पा. २
वडा ७





स्याउ जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २१





च्यांग्रा जोनको कार्यक्षेत्र



मस्ताङ्ग जिल्ला




जिल्ला १
गा.पा. ३
वडा ११





परियोजनाको संक्षिप्त परिचय




१. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:

मुस्ताङ:- स्याउ, च्याङ्ग्रा, आलु, याक चौरी, उवा/जौ


म्याग्दी जिल्ला: सुन्तला, बंगुर, आलु, बाख्रा, तरकारी

२. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको आयात/निर्यातको अवस्था:

बालि वस्तु	निर्यात परिमाण	औषत मुल्य रु
स्याउ	४४६० मे.टन	११० प्रति के.जि.
च्याङ्ग्रा	८००० बटा	३७,००० प्रति गोटा
आलु (मुस्ताङ)	५७३६.६ मे टन	२०० प्रति पाथि(प्रति पाथि ३ के जि)
च्याङ्ग्रा सुकुटी	२ मे. टन	८५०० प्रति के.जि.
याक सुकुटी	५ मे. टन	६५०० प्रति के.जि.
सुन्तला	३,६९३ मे. टन	९० प्रति केजी



परियोजनाको शुरु आ.व. देखि हाल सम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण (बजेट लाखमा)

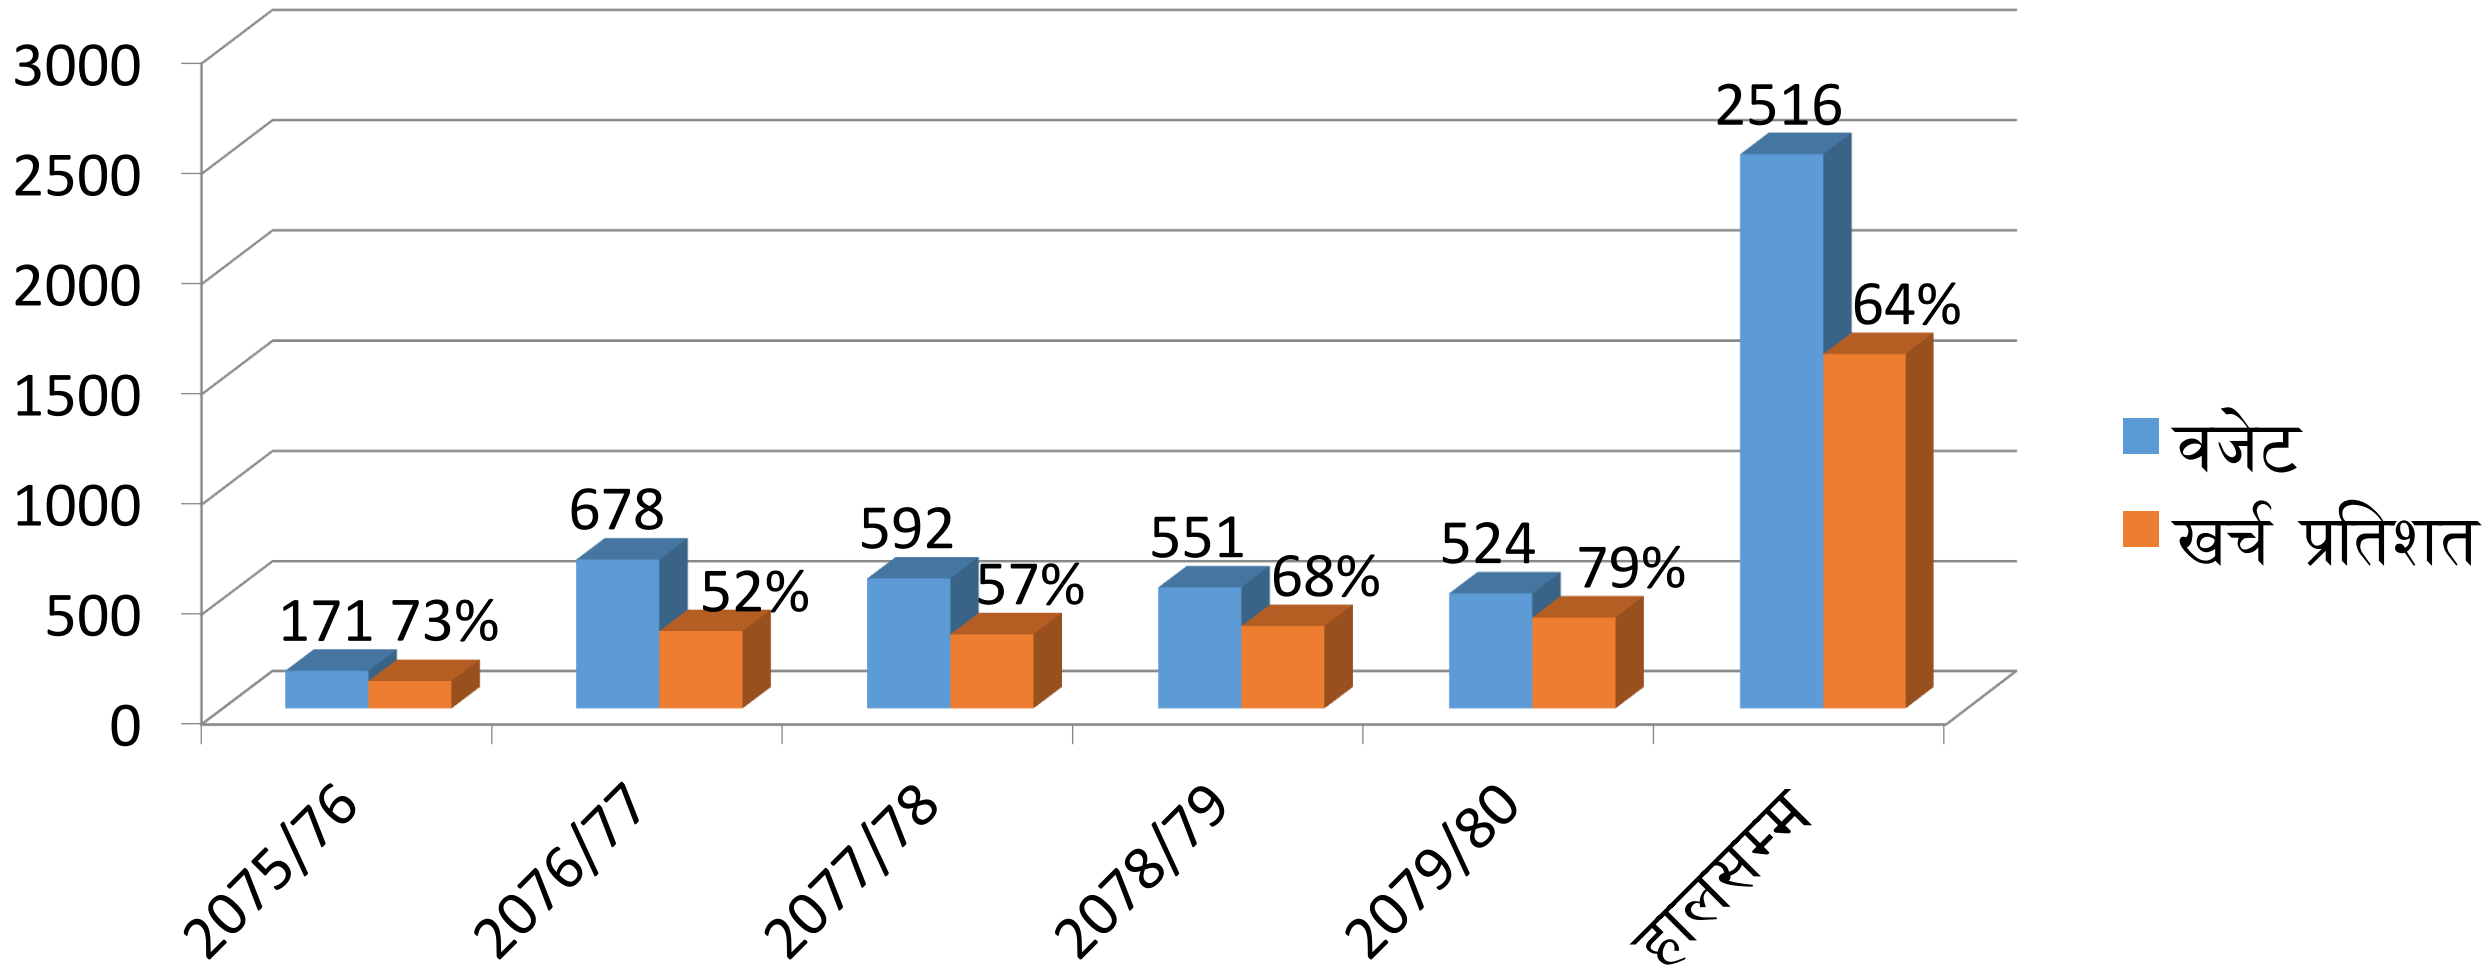




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
१.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण सुधार	संख्या	०	०	७	१३	१०	३०	जोन क्षेत्रभिन्न सिंचाइका लागि पोखरी, कूलो निर्माण, पाइप, थोपा सिंचाइ (थप २०५ रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
२.	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग	पटक	१	१	१	१	१	५	ग्राइड मेसिन ४, मिनिटिलर ६५, पावर स्प्रे ४१, ग्रास कटर ६०, डिजिटल तराजु ५१, ह्याण्ड स्प्रे २३, फुट स्प्रे ३७, सुकुटी मेसिन ४७, सानो सिकेचर १६३, ठूलो सिकेचर १०, स्याउ पिकर ७१, क्लिपर ४८, करौती ७३, क्रेट २१९० वितरण।
३.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हे.		०	२१.७	२२.६	१०	१०	६४.३	उच्च घनत्व १८००० र स्थानीय बेर्ना १९८४० वितरण
४.	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	०	०	२	१	२	५	धमाङ्, मार्फा, खिङ्गा र कागवेनी गरी ५ वटा ५७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको।




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
५.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक	०	०	१	०	०	१	कोबाङ, मुस्ताङको शिक्षालयमा तरकारी खेती, आलु खेती तथा आलु चिप्स बनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन भएको।
६.	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	१	०	२	०	३	स्याउको बेर्ना उत्पादनको ३ वटा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएका
७.	खोर निर्माण सुधार सहयोग	संख्या	०	०	०	७	१०	१७	बारागुड र लोघेकर दामोदरकुण्ड गा. पा.मा १७ वटा च्याङ्गा गोठ सुधार गरिएको।
८.	पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण	संख्या				१	२	३	बारागुड, लोघेकर र लोमान्थाङ गा.पा.मा ३ वटा पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण भएको।




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
(म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
१.	कृषि यान्त्रिकरण	पटक	१	१	१	१	१	५	मागको आधारमा कृषि औजार उपकरण वितरण
२.	साना सिंचाई	संख्या	०	९	२१	१९	१८	६७	ट्याङ्की निर्माण पोखरी निर्माण र पाइप वितरण (थप ३६० रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
३.	कृषि बजार भण्डारण प्रशोधन उद्योग	संख्या	०	०	०	१	२	३	१० टन भण्डारण क्षमताका ३ वटा कोल्ड स्टोर
४	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	हे.	८० हे.	१८३ हे.	६९ हे.	२० हे.	१.५ हे.	३५३.५ हे.	कलमी तथा विजु विरुवा वितरण



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०		
४.	स्थानीय तहसङ्गको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	४	५	२	३	१४	स्क्रीन हाउस निर्माण र विरुवा उत्पादन
५	पशु नक्षश्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	१	१	३	५	५ वटा पशु नक्षश्रोत केन्द्र निर्माण भएको।
६.	खोर सुधार (बंगुर)	संख्या	०	१२	०	७	८	२७	२७ वटा खोर निर्माण सुधार भएको
७.	मासु पसल सुधार निर्माण	संख्या	०	३	२	१	२	८	८ वटा मासुपसल सुधार भएको




परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन



- स्याउको भण्डारण पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अनुरूप कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी बजार लैजादा स्याउको १००% सम्म मुल्य अभिवृद्धि भएको हुनाले कोल्ड स्टोरेजको महत्व बढेको छ। जस अनुसार हाल सम्म परियोजना क्षेत्रमा ७ वटा कोल्डरुम निर्माण भईसकेका छन भने यस आ.व. मा कोल्डस्टोरेज को माग १८ वटा रहेकोमा ३ वटा निर्माणको क्रममा रहेका छन।
- उच्च घनत्व स्याउ खेतिमा कृषकहरु आकर्षित रहेका जसले स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको। परियोजना क्षेत्रको ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व स्याउ खेति भैरहेको।
- परियोजनको सहयोगमा सुन्तलाजात विरुवा उत्पादनको लागी स्क्रीन हाउस निर्माण भई गुणस्तरिय सुन्तलाजात फलफुल विरुवामा जोन क्षेत्र आत्मनिर्भर भई अन्य जिल्लाहरुमा समेत विरुवा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको।




यस आ.व.मा सुचिकृत भएका लाभान्वितहरूको विवरण



जोन	चालु आ व २०८०/०८१ मा थप सुचिकृत			
	सहकारी	समुह	निजि उद्धमी	जम्मा
सुन्तला	०	१	२२	२३
बंगुर	१	०	७	८
आलु	१	४	२	७
स्याउ	०	०	२३	२३
च्यांग्रा	०	१	१३	१४
जम्मा	२	६	६७	७५



यस आ.व. २०८०/८१ मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु




क्र.स.	प्राथमिकताका कार्यक्रमको नाम	एकाइ	लक्ष्य	बजेट	हाल सम्मको प्रगति
१	कृषि बजार भण्डारण पूर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	३	४८००	१ निर्माण सम्पन्न २ सम्झौता भई निर्माण कार्य भैरहेको
२	पशु नस्ल स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	३	४८००	१ निर्माण कार्य सम्पन्न, २ निर्माण कार्य भैरहेको
३	सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	२९	४६४०	निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्य भैरहेको
४	खोर सुधार सहयोग	संख्या	१८	५६२५	निर्माण कार्य सम्पन्न हुदै
५	पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	संख्या	१४५	२७००	सम्झौता भई कार्यान्वयन भैरहेको

कृषि मूलश्र्चः जीवनम्



आयोजना/कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिहरू



चालु आ.व. २०८०/८१ मा परियोजना कार्यान्वयन एकाइले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू

1. कार्यान्वयन एकाइ क्षेत्रभिन्न आलु, सुन्तला र स्याउमा ३ वटा १० मे. टन क्षमताका कोल्ड स्टोर /रष्ट्रिक स्टोर भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भएको हुनेछ।
2. आलु, सुन्तला र स्याउ जोन क्षेत्रमा २९ वटा साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएको हुनेछ जसबाट थप २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ।
3. बंगुरमा १(कम्तिमा २० माउ) र च्याङ्ग्राका २(कम्तिमा १५० माउ) पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ।
4. बंगुरमा ११ (कम्तिमा २० बंगुर/खोर) र च्याङ्ग्राका ७ (कम्तिमा १०० च्याङ्ग्रा/खोर) सुधारिएका खोर निर्माण तथा सुधार भएको हुनेछ।
5. बंगुर र च्याङ्ग्रामा १४५ संख्यामा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ।




जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व



क्र.स	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./संख्या/ली	उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१	स्याउ	१४०० हे.	४६७० मे.ट.	९.३४	८.४५	५०० हे उत्पादनशिल
२	सुन्तला	१०३० हे.	३८७७ मे.ट.	१०.७७	९.५१	३६० हे उत्पादनशिल
३	च्याङ्गा	५१९० माउ	५१९० पाठापाठी प्रति वर्ष	१ पाठा/माउ/वर्ष	१.५ पाठापाठी/माउ/वर्ष	५१९० माउ
४	बङ्गुर	५२७ माउ	१०५४० पाठापाठी प्रति वर्ष	२० पाठापाठी प्रति माउ प्रति वर्ष (२ वेत)	१२ पाठापाठी प्रति माउ प्रति वेत	
५	आलु	४१० हे.	९१०२ मे.ट.	२२.२	१७.२०	




तेस्रो त्रैमासिक तथा ९ महिना अवधिको प्रगति विवरण



कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेस्रो त्रैमासिक	९ महिना
	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट (लाखमा)	भारित प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	५	३.९	१९००	०	०	०		१००
चालू तर्फ	४८२१	९६.१	४७०२५	१२६६	१८.३९	९०.०७	७२.३	७०.४
जम्मा	४८२६	१००	४८९२५	१२६६	१८.३९	९०.०७	७२.३	७२.१




तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगति विवरण (रु.हजारमा)				
कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक खर्च	तेस्रो त्रैमासिक खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	१९००	०	१३३९.४५	
चालू तर्फ	४७०२५	९००७	३६५५.२७	४०.५८
जम्मा	४८९२५	९००७	४९९४.७२	५५.४५




९ महिना अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगति विवरण (रु.हजारमा)				
कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन	९ महिनाको विनियोजन	९ महिनाको खर्च	९ महिनाको खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	१९००	५५०	१७३९.४५	१००
चालू तर्फ	४७०२५	१८६८३	९६४५.४०	५१.६२
जम्मा	४८९२५	१९२३३	११३८४.८५	५९.१९




९ महिना अवधिको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू




क्र.सं	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी
१	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (ऋप कटिङ)	२० जना स्याउ कृषकहरूको बगैचाको ऋप कटिङ गरिएको। १५ जना सुन्तला कृषकहरूको ऋप कटिङ सम्पन्न गरिएको।
२	व्यावसायिक च्याङ्गापालन कृषक तालिम	२० जना व्यावसायिक च्याङ्गापालक कृषकहरू लाभान्वित भएका।
३	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	६० जना स्याउ कृषकहरू लाभान्वित भएका।
४	जिल्ला स्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रीकरण कृषक तालिम	सुन्तलामा उन्नत प्रविधि सम्बन्धी कृषक तालिमबाट २१ जना कृषकहरू लाभान्वित भएका।
५	स्याउ, सुन्तला, च्याङ्गा, बंगुर र आलु जोन विकास कार्यक्रममा माग आवेदन पेश गरेका कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी मध्येबाट फिल्ड अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरि छनौट भएका अनुदानग्राहीहरूसँग सम्झौता गरि कार्यान्वयन हुँदै।	



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	६१	३९	०८०/९/१९-१०/४	कृषकहरु मार्फत खरिद सम्पन्न, भुक्तानि हुदै
२	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	५३	८	०८०/९/१९-१०/४	निर्माण कार्य हुदै
३	भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	६	१	०८०/९/१९-१०/४	निर्माण कार्य भैरहेको
४	कृषि उपज बिक्री वितरण केन्द्र निर्माण	२	संख्या	स्याउ जोन	२०८०।०६।०५	१५	२	०८०/९/१९-१०/४	निर्माण हुदै




९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति


क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
५	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार	१६	हेक्टर	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६ २०८०।०९।०३	६	६	१०/०५- १०/२०	१२ हे. क्षेत्र विस्तार भैसकेको भुक्तानी हुदै
६	प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	१	पटक	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६ २०८०।०९।०३ २०८०।१०।११	०	०	०	४ पटक सूचना गर्दापनि माग नभएको
७	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६ २०८०।०९।०३ २०८०।१०।११	५	५	११/१५- ११/३०	कृषकहरू मार्फत खरिद हुदै
८	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१४	संख्या	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६ २०८०।०९।०३ २०८०।१०।११	८	८	११/१५- ११/३०	निर्माण कार्य हुदै फिल्ड अनुगमन हुदै
९	भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	आलु जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६ २०८०।०९।०३	१	१	११/१५- ११/३०	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१०	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नस्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	१	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	५	१	९/२०-१०/५	निर्माण सम्पन्न भुक्तानी हुदै
११	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	४५	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	४५	४५	११/१-११/१५	कार्यान्वयन हुदै
१२	विपन्न वर्ग लक्षित उन्नत बंगुरपालन कार्यक्रम	३०	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	३०	३०	९/२०-१०/५	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाँकी
१३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५	९	९	९/२०-१०/५	कार्यान्वयन हुदै
१४	मासु वसल सुधार कार्यक्रममा सहयोग	२	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६	२	२	९/२०-१०/५	सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१५	खोर सुधार सहयोग	११	संख्या	बंगुर जोन	२०८०।०६।०५ २०८०।०७।१६	१३	११	९/२०-१०/५	निर्माण हुदै




९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयन को अवस्था
१६	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नस्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	२	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	२०८०।०६।०५	७	२	९/१८-१०/२	निर्माण हुदै
१७	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम(साइलेज, U M M B, तथा अन्य)	१	पटक	च्याङ्ग्रा जोन	२०८०।०६।०५	३५	३५	११/१-११/१५	कार्यान्वयन हुदै
१८	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	१००	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	२०८०।०६।०५	३५	३५	११/१-११/१५	कार्यान्वयन हुदै
१९	खोर सुधार सहयोग	७	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	२०८०।०६।०५	१६	७	९/१८-१०/२	निर्माण कार्य हुदै




९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	छनौट संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
२०	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	२०	१५	११/०६-११/२५	कृषकहरू मार्फत खरिद हुदै
२१	सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	९	संख्या	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	२३	११	११/६-११/२५	निर्माण तथा मर्मत कार्य हुदै
२२	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८०।०६।०५	३	१	११/६-११/२५	निर्माण कार्य हुदै




प्रगति नपुगका कारणहरु



क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	विपन्न वर्ग लक्षित उन्नत बंगुरपालन कार्यक्रम	संख्या	३०	०	३०	कार्य सम्पन्न भैसकेको, फिल्ड भेरिफिकेसन गरि भुक्तानी हुने।
२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	पटक	१	०	१	कषकहरुमार्फत खरिद भैसकेका, भुक्तानी बाँकी
३	मासु वसल सुधार कार्यक्रममा सहयोग	संख्या	२	०	२	फिल्ड भेरिफिकेसन र भुक्तानी बाँकी
४	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम(साइलेज, U M M B, तथा अन्य)	पटक	१	०	१	कार्यक्रम कार्यान्वयन हुदै
५	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	१६	०	१६	१२ हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार भैसकेको, भुक्तानी बाँकी



ब्लकको प्रगति विवरण




क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लकको संख्या	आ व २०८०/८१ को ब्लकको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८०/८१ को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
चालु आ.व. मा नयां तथा निरन्तरता कुनै पनि ब्लक संचालनमा नरहेको ।					

कृषि मूलशचः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण म्याग्दी




क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या निरन्तरता	आ व २०८०/८१ को पकेटको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८०/८१ को अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
१	आलु	४	२४००	खर्चको विवरण प्राप्त हुन बाकी	सम्झौता भई काम सुरु भएको
२	सुन्तला	२	१२००	खर्चको विवरण प्राप्त हुन बाकी	सम्झौता भई काम सुरु भएको
३	केरा	१	६००	खर्चको विवरण प्राप्त हुन बाकी	सम्झौता भई काम सुरु भएको
४	बाखा	१	७००	खर्चको विवरण प्राप्त हुन बाकी	सम्झौता भई काम सुरु भएको
	जम्मा	८	४९००		

कृषि मूलश्र्चः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण मुस्ताङ




क्र.सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या निरन्तरता	आ व २०८०/८१ को पकेटको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८०/८१ को अर्द्ध- वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
१	आलु	३	२४००	६००	सम्झौता भई काम सुरु भएको
२	स्याउ	२	१२००	६००	सम्झौता भई काम सुरु भएको
३	च्याङ्ग्रा	१	७००	०	सम्झौता भई काम सुरु भएको
	जम्मा	६	३७००	१२००	३२.४३%

कृषि मूलश्रम: जीवनम्



बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण



क्र.सं.	आ. व. २०७८/७९ सम्म फछ्यौट गर्नु पर्ने बेरुजु विवरण			आ व २०७९/८० को वार्षिक अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु.	बेरुजु फछ्यौटको लागि पेश भएको रकम रु.	कैफियत
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु.	असुल गर्नु पर्ने रकम रु.	जम्मा बेरुजु रकम रु.	नियमित गरेको रकम रु.	असुल गरेको रकम रु.	जम्मा रु.			
१	४६४,२२०	१०५,९००	५७०,१२०	४,६४,२२०	१०५,९००	५७०,१२० ०		५,७०,१२०	असुल गरेको रकमको सकल भौचर सहितका विवरणहरु सम्परीक्षणको लागि मिति २०७९/९/२२ मा परियोजना व्यवस्थापन एकाई, खुमलटारमा बुझाईएको।



जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	०	१	रिक्त
२	कृषि अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	२	२	०	स्थायी
३	पशु विकास अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	१	०	१	रिक्त
४	प्राविधिक सहायक	१	०	१	रिक्त
५	नायव प्राविधिक सहायक	१	१	०	स्थायी
६	रा.प.अनं.प्र.प्र. (लेखापाल)	१	०	१	रिक्त
७	रा.प.अनं.प्र.प्र. (ना सु)	१	०	१	रिक्त
८	पशु सेवा तथा कृषि प्राविधिक नायव प्राविधिक सहायक	७	७	१	१ रिक्त, ६ करार सेवा
९	ह.स.चा.	१	१	०	करार सेवा
१०	का.स.	३	३	०	करार सेवा
जम्मा		१९	१३	६	




भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण




क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	४	मर्मत गर्नुपर्ने	मुस्ताङमा आवास भवन सहित
२	गाडी	१	चालु	कमजोर अवस्था
३	मोटरसाईकल	६	३ चालु	१ मर्मत हुन सक्ने २ मर्मत पनि हुन नसक्ने
४	कम्प्युटर/ल्यापटप	१० ल्यापटप ११ कम्प्युटर	३ ल्यापटप र ५ कम्प्युटर चालु	अन्य ५ मर्मत गर्नु पर्ने र बाँकी ८ मर्मत पनि हुन नसक्ने
५	प्रिन्टर/प्रोजेक्टर	१४ प्रिन्टर र ३ प्रोजेक्टर	८ प्रिन्टर र २ प्रोजेक्टर चालु	अन्य २ प्रिन्टर मर्मत हुन सक्ने र ४ प्रिन्टर मर्मत पनि हुन नसक्ने । जोन इकाई म्याग्दी र प्रशासनिक इकाई मुस्ताङका सामान । पुराना सामानहरु साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङबाट आएका ।



परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



समस्याको किसिमच	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	<p>कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा तहगत तथा निकायगत फरकपन</p> <p>उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्रतिशत फरक रहेको। परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विधि प्रकृया लगायतका विवरणहरू अप्रयाप्त रहेको।</p>	<p>डुप्लिकेशन नहुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने कोशिस गरिएको।</p>
प्राविधिक	<p>जनशक्ति अभाव (प.वि.अ. र प्रा.स. शुरू देखि नै रिक्त तथा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी रिक्त रहेका) १९ जनाको दरवन्दीमा १३ जना मात्र कार्यरत</p>	<p>उपलब्ध करारका प्राविधिकलाई जिन्सी तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिईएको।</p> <p>उपलब्ध जनशक्ति बाट जिम्मेवारी बाँडफाड गरि कार्यक्रम संचालन गरिएको।</p>
व्यवस्थापकिय	<p>फराकिलो कार्यक्षेत्र भौगोलिक बिकटताले गर्दा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ आवतजावत गर्न गाह्रो तथा कृषि र पशुसेवाका फरक फरक ५ वटा जौनहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई। उपलब्ध सवारी साधन पुरानो तथा बिग्रिरहने।</p>	<p>बस, ट्याक्सी तथा भाडा गाडी रिजर्व गरी फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।</p>



संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

स्याउ भण्डारणको लागी चिस्यानगृह



Bizkhabar

Oct 15 · 🌐

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

<https://www.bizkhabar.com/agriculture-and-corporate-news/174126.html>



BIZKHABAR.COM

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने काठमाडौं । चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि ...

व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालक कृषक तालिम

च्याङ्ग्रापालन कृषकहरूलाई व्यवसाय सुधार तालिम



by आरसी टाइम्स

१५ आश्विन २०८०, सोमबार १५:१९



SHARES




आरसी टाइम्स व्युरो

मुस्ताङ्ग, असोज १५

मुस्ताङ्गका च्याङ्ग्रा पालनमा सहभागी कृषकहरूलाई २ दिने व्यवसाय सुधार तालिम दिएर सहजीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन एकाई, मुस्ताङले हालै असोज ११ र १२ गते उपल्लो तीन गाउँपालिकाका किसानहरूलाई व्यवसाय सुधार तालिम दिइएको परियोजना एकाइ प्रमुख सुधिर थापाले जनाएका छन ।

परियोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको उपल्लो मुस्ताङका लोधेकर दामोदरकुण्ड गाँउपालिका, लोमान्थाङ गाँउपालिका र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँउपालिकाका १४ व्यवसायिक फार्म र ६ किसान समेत गरि २० जनालाई तालिम दिइएको थापाले जनाएका छन ।



संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

onlinekhabar

English health

सुस्ताडबाट ४९ करोडको स्याउ निकासी

सधैं **KFC**

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER CARE CENTRE 01-5970015
customercare@coblbank.com

अन्नपति

२२ नवम्बर, प्यान्दी । मुस्ताङबाट यस वर्ष ठ ४९ करोडभन्दा बढी मूल्यको स्याउ निकासी भएको छ । स्याउ निकासीबाट निकासी हुने प्रमुख कृषि उपज हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मुस्ताङसहित स्याउ जैन कार्यालयले यस वर्ष उत्पादन भएको ९० प्रतिशत स्याउ बज्रतमा निकासी भइसकेको जनाएको छ ।

स्याउ जैन मुस्ताङका प्रमुख नैऋत्समा पर्ने किलेभार पार हजार मी सय ७५ मिटरिक टन स्याउ उत्पादन भएको नवम्बर पार हजार पार सय ७७ टनसम्म पार मिटरिक टन स्याउ देशका विभिन्न ठाउँमा निकासी भएको बताए ।

धौलागिरि खबर

स्याउ भण्डारणका लागि चिस्यानगृह प्रभावकारी

धौलागिरि खबर

२०८० आश्विन २८, आईतवार २०:४२ गते मा प्रकाशित

165 0

मार्फाको चिस्यान गृहमा स्याउ भण्डारण गर्दै ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु । असल नागरिकको परिचय दिनु ।
सैद्ध्यिक, ज्ञानीय समाजत सधै कसिमका विभेद चिस्टु सुटी ।
कुरीतिको अन्त्य नरी सभ्य समाज निर्माण नरी ।

मार्फा ः चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि मुस्ताङका कृषकको स्याउ कुहिपेर फाल्नुपर्ने समस्या हट्नु थालेको छ ।

मुस्ताङका स्याउ कृषकलाई रु. ३८ लाख अनुदान


धौलागिरि खबर २०८० पुष २९, आईतवार ०९:२३ गते मा प्रकाशित 702 0

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु । असल नागरिकको परिचय दिनु ।
सैद्ध्यिक, ज्ञानीय समाजत सधै कसिमका विभेद चिस्टु सुटी ।
कुरीतिको अन्त्य नरी सभ्य समाज निर्माण नरी ।

जोमसोम, मुस्ताङका स्याउ कृषकहरूले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रु. ३८ लाख भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।

स्याउको ब्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र (जोन) कार्यालय मुस्ताङले यान्त्रीकरण, चिस्यानगृह, संकलन केन्द्र र सिचाई योजना निर्माणका लागि रु. ३८ लाख ६० लाख अनुदान पाउने ५० वटा फर्म, कृषक समूह र सहकारी छनीट गरेको हो ।



संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना



मुस्ताङका कृषकलाई गोठ सुधार र स्रोत केन्द्रमा च्याङ्ग्रा जोनको सहयोग

धौलागिरी खबर २०८० पुष ११, विहीवार २०:५० बजे ला प्रकाशित १६० ०



सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रोथ सामुदायिक समारोहको संरक्षण गर्दै । असल जनसंख्याको परिचय दिने । सैद्धान्तिक, ज्ञानीय लगायत हबै किसिमका विभेद विरुद्ध युटी । दुरीतिको अन्त्य नरी सभ्य समाज निर्माण गर्दै ।

जोमसोम, ०: मुस्ताङका कृषकलाई गोठ सुधार र स्रोत केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको च्याङ्ग्रा ब्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र (जोन)ले जोड दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा खोर सुधारका लागि ७ वटा र स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न दुई वटा फर्मले रु. पचास लाख ४७ हजार अनुदान पाउने भएका छन् । परियोजनाको प्राविधिक समितिका बुधवार जोमसोममा बसेको बैठकले खोर सुधार र स्रोत केन्द्र स्थापना शीर्षकमा

मुस्ताङका ३ पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन

सुन्दरकुमार थकाली
जोमसोम, १८ पुस

हिमाली जिल्ला मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमध्ये ३ वटा पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ । जिल्लाको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र वारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

जिल्लाको च्याङ्ग्रा पालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यवसायमूलक बनाई च्याङ्ग्रापालन हबको रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुस्ताङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि ५ वर्षका लागि च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यक्रमले मुस्ताङका च्याङ्ग्रा पालन व्यवसाय गर्दै आइरहेका पशुपालक व्यवसायलाई उत्पादनशीलका साथै पशुपालन क्षेत्रमा स्थानीय कृषकहरूलाई आकर्षित गराउने उद्देश्य च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख नेत्र भट्टले जानकारी दिए । परियोजनाको जोन मापदण्डमा रहेर उपल्लो भेकका ३ पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम लागु भएको इकाई प्रमुख भट्टको भनाई छ ।

परियोजना अन्तर्गत च्याङ्ग्रा जोन



च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८६ लाख ८९ हजार विनियोजन

नशल स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी प्रत्येक स्रोत केन्द्र निर्माणमा १४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने छ । पशुको नशल सुधारका लागि उन्नत च्याङ्ग्राको बोका खरिद गरी वितरण


अनुदान शीर्षकमा खर्च गरिएको थियो । गतवर्ष च्याङ्ग्रा जोन अन्तर्गत लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा ४ वटा र वारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा ६ वटा गरी १० वटा खोर सुधार भएका थिए । जसमा प्रत्येक खोरका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी प्रतिखोर सुधारमा ३ लाख अनुदान दिइएको थियो ।

यसैगरी पशुको २ वटा नशल स्रोत केन्द्र निर्माणमा २८ लाख अनुदान दिइएको थियो । अनुदान लोघेकर दामोदरकुण्डमा १ र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १ वटा पशु नशल स्रोत केन्द्र निर्माण भएका थिए । गत वर्ष पशुको नशल सुधारका लागि १४ वटा उन्नत च्याङ्ग्राको बोका वितरण गरिएको थियो ।

च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ लाख ३० हजार

पोखरा, कास्की वडा फुट्ट्या विभिन्न गरेको कास्की पो का मिर हिरासत जिल्ला फो जाहेरीद गरी अ मुद्दामा थुनामा






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

स्याउमा ऋप कटिड गरिदै



स्याउमा ऋप कटिड गरिदै






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

उत्कृष्ट कृषक, कर्मचारी अध्ययन अवलोकन भ्रमण, जुम्ला






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

उत्कृष्ट कृषक, कर्मचारी अध्ययन अवलोकन भ्रमण, वन्दिपुर





मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालन कृषक तालिम

घरपूझोड कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा परियोजनाको तर्फबाट सुचना केन्द्र सन्चालन






सुन्तलामा ऋप कटिड



कृषि मूलशचः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक




च्याङ्ग्रा जोन क्षेत्रमा फिल्ड भेरिफिकेसन

कृषि मूलशचः जीवनम्




मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



म्याग्दी जिल्लाको सुन्तला जोन क्षेत्रमा फिल्ड अनुगमन

कृषि मूलशचः जीवनम्




मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

परियोजनाको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा स्याउ भण्डारण गरिदै



मुस्ताङमा उत्पादित उच्च घनत्व स्याउको प्रदर्शनी (घरपझोड महोत्सव)






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

आलुको क्षेत्र विस्तार





मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

आलुको रष्टिक स्टोर निर्माण






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

साना सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत सिचाई पोखरी निर्माण






मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



बंगुर खोर निर्माण सहयोग





मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

सुन्तला जोन क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग

यान्त्रिकरण सामग्री लिदै कृषकहरू



2024/2/23 12:51



धन्यवाद
